PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
BEAVER RESERVOIR
WHITE RIVER, ARKANSAS

SEC. 16, T 17-N, R 28-W COUNTY WASHINGTON

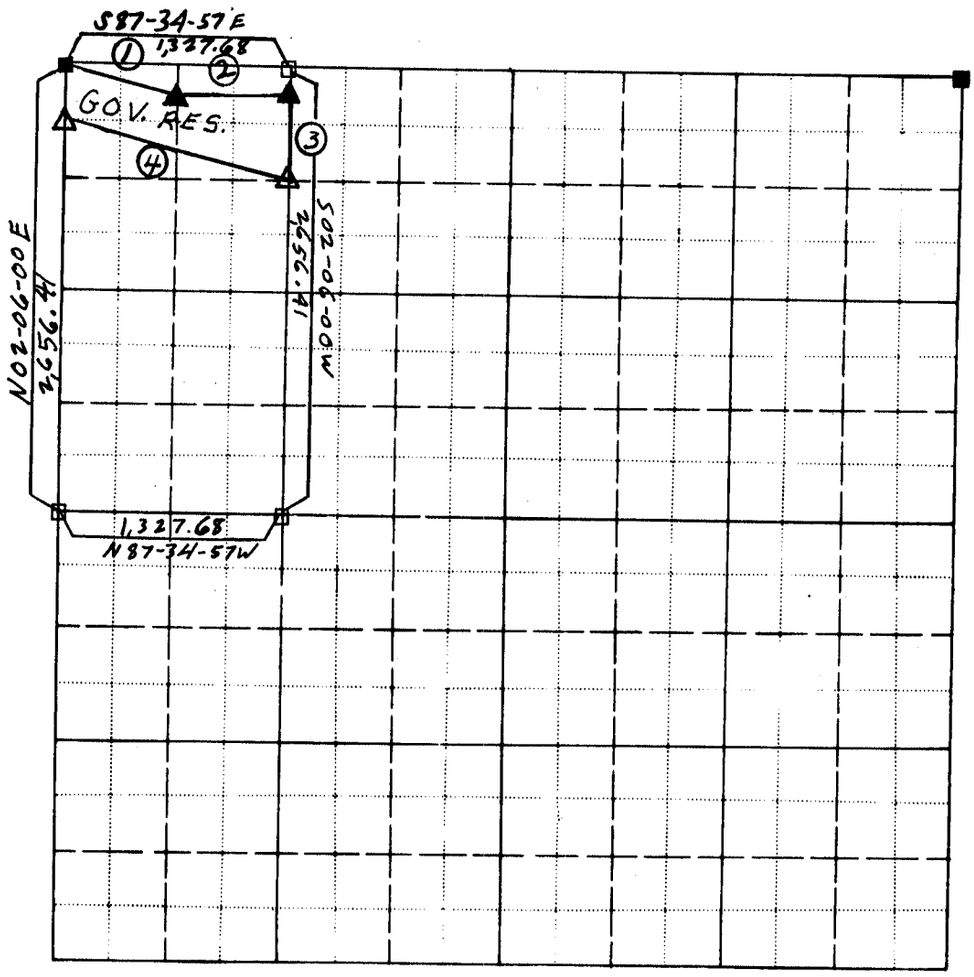

FULL SEC APPROX SCALE 1:12,000

TRACT NO	COURSE NO.	MONUMENT NO.	ANGLE / GRID BEARING	ELEVATION / DISTANCE	POSITION / NORTH	POSITION / EAST	REMARKS
		2131-2 = 2132-1		1165.69	667,020.63	1,415,910.84	
	1		S73-23-54E	348.73			
		2132-1A			666,920.99	1,416,245.03	
	1		S73-23-54E	336.47			
		2132-2			666,824.78	1,416,567.73	
	2		S87-25-15E	664.22			
		2132-3			666,794.89	1,417,231.28	
	3		S02-15-33W	497.73			

Field Book No. 67-B-116 TRANSIT Date: JAN 1968
67-B-117 CHAIN
67-B-118 Level

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION _____, T _____, R _____.

_____
COUNTY, ARKANSAS

U. S. ARMY ENGINEER DISTRICT, LITTLE ROCK
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 1 of 2

GN MN 1°10' 7°04'E

LEGEND
- ▲ MONUMENT TYPE 1
- △ MONUMENT TYPE 3
- ● FOUND I. P.
- ○ SET I. P.
- ■ FOUND STONE
- □ COMPUTED CORNER
- ✱ OTHER

PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
BEAVER RESERVOIR
WHITE RIVER, ARKANSAS

SEC. 16, T - 17-N, R - 28-W COUNTY WASHINGTON

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	GRID BEARING	ELEVATION DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
		2132-4			666,297.55	1,417,211.66	
	4		N73-24-53W	192.01			
		2132-4A			666,352.36	1,417,027.64	
	4		N73-24-53W	297.07			
		2132-4B			666,437.16	1,416,742.93	
	4		N73-24-53W	476.57			
		2132-4C			666,573.19	1,416,286.19	
	4		N73-24-53W	404.72			
		2132-5 = 2131-3		1125.68'	666,688.56	1,415,898.81	

SHEET 2 of 2

SWL FORM 136
REVISED FEB 66
