BOUNDARY SURVEYS
CLEARWATER LAKE
BLACK RIVER, ARKANSAS & MISSOURI

SECTION 31 ,T 30N ,R 2E COUNTY REYNOLDS

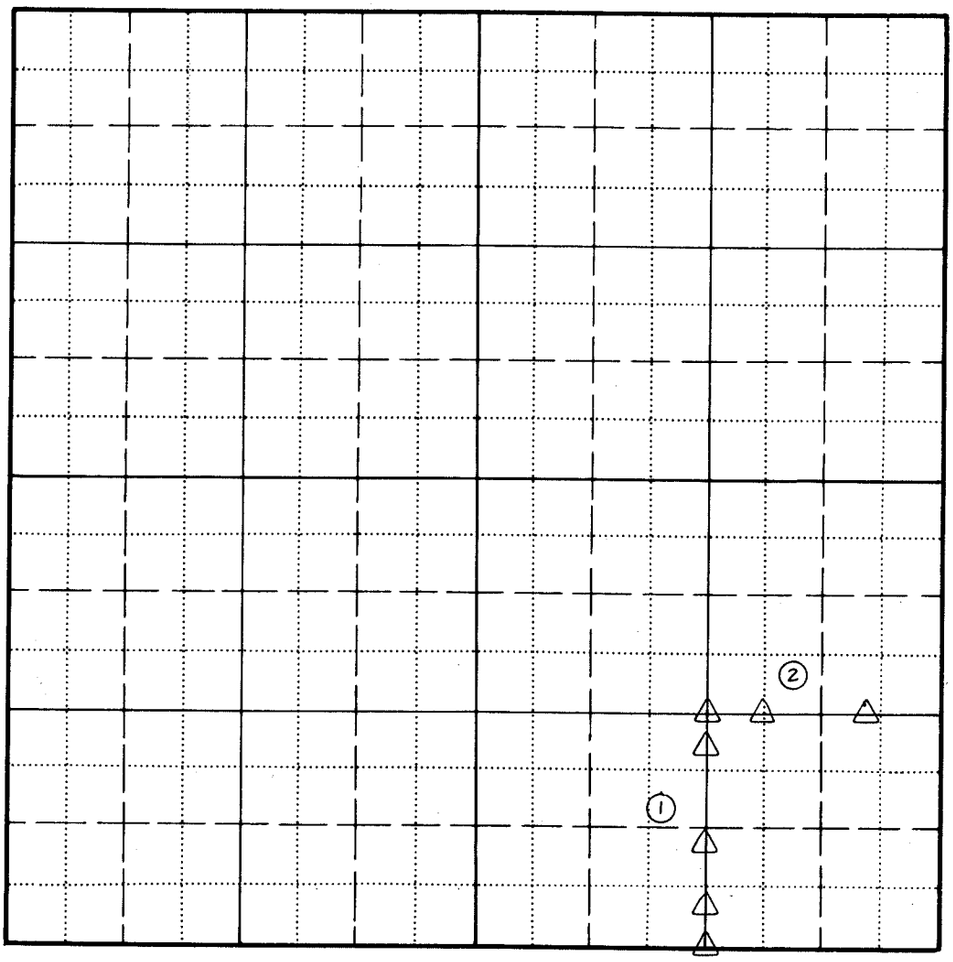

FULL SECTION APPROXIMATE SCALE 1:12,000

56-6

COURSE NO.	MONUMENT NO.	GRID BEARING	ELEVATION / DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
	56-7			507,427.40	391,366.64	Yield stone set T-3
1		N 00-49-00 E	321.25			
	56-7A			507,748.62	391,371.22	T-3
1		N 00-49-00 E	235.27			
	56-7B			507,983.86	391,374.57	T-3
1		N 00-49-00 E	661.23			
	56-7C			508,645.03	391,384.00	T-3
1		N 00-49-00 E	93.95			

Field Book No. 80-C-3 Date: 1980

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION _____, T _____, R _____.

COUNTY, ARKANSAS

SURVEYOR REG. NO.

U. S. ARMY ENGINEER DISTRICT, LITTLE ROCK
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 1 OF 2

GN MN

LEGEND

- ▲ MONUMENT TYPE 1
- △ MONUMENT TYPE 2
- ● FOUND I. P.
- ○ SET I. P.
- ■ FOUND STONE
- □ COMPUTED CORNER
- ✳ OTHER

CLEARWATER LAKE
BLACK RIVER, ARKANSAS & MISSOURI

SECTION 31 **, T** 30N **, R** 2E **COUNTY** REYNOLDS

COURSE NO.	MONUMENT NO.	GRID BEARING	ELEVATION / DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
	56-8			508,738.97	391,385.34	T-3
2		S 88-45-48 E	272.96			
	56-8A			508,733.08	391,658.23	T-3
2		S 88-45-48 E	536.81			
	56-8B			508,721.49	392,194.91	T-3
2		S 88-45-48 E	568.44			
	56-8C			508,709.22	392,763.23	T-3 in Sec 32

SHEET 2 OF 2

SWL FORM 136
REVISED OCT. 1971
