PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
DARDANELLE RESERVOIR
ARKANSAS RIVER, ARKANSAS

SEC. 30, T -8-N, R -21-W COUNTY POPE

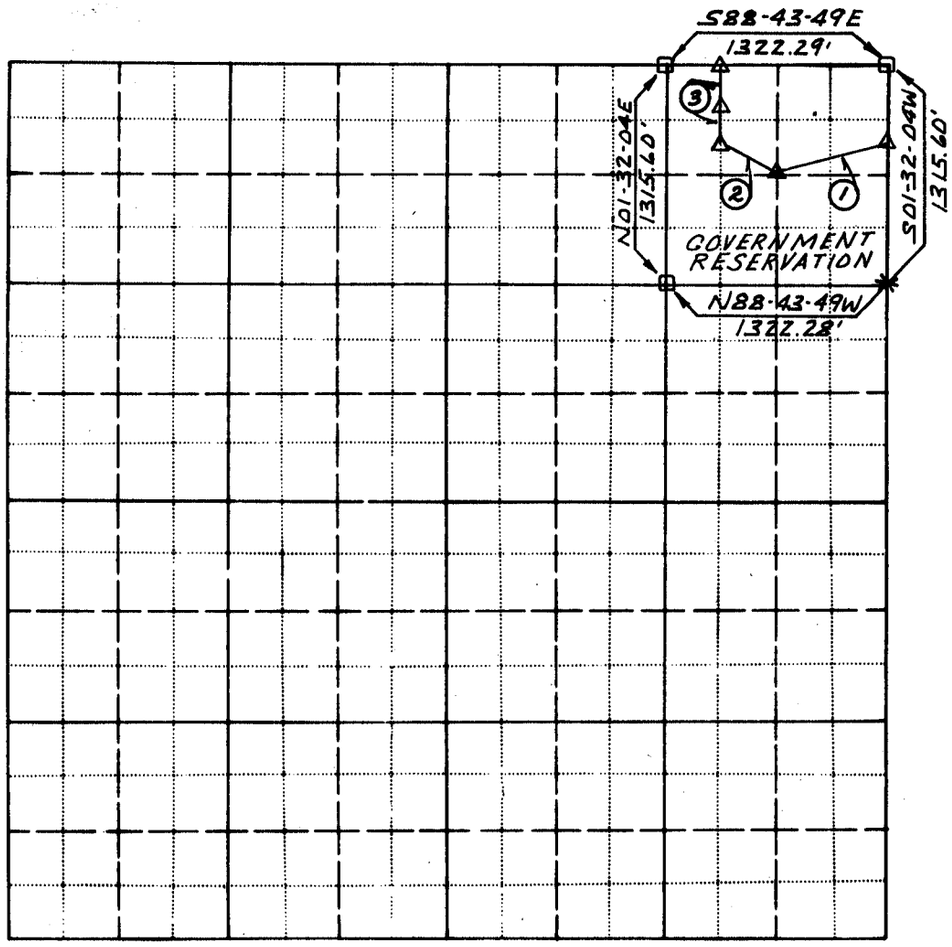

FULL SEC. APPROX SCALE 1:12,000

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	ANGLE GRID BEARING	ELEVATION DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
		512-8= 528-1-1		350.37'	362,581.83	1,623,321.79	
	1		S77-19-00W	406.85'			
		528-1-1A		349.83'	362,492.50	1,622,924.87	
	1		S77-19-00W	194.48'			
		528-1-1B		349.98	362,449.80	1,622,735.14	
	1		S77-19-00W	80.70'			
		528-1-2		345.76	362,432.08	1,622,656.40	
	2		N62-13-40W	246.17'			

Field Book No. 67D-23 & 24 Date: Nov. 67
67D-25
73D-17 ∡'s
73D-18 Chain & Levels

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION _____, T _____, R _____.

_____
COUNTY, ARKANSAS

U. S. ARMY ENGINEER DISTRICT, LITTLE ROCK
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 1 of 2

GN MN
0°-43'-04" 6°-05E

LEGEND

- ▲ - MONUMENT TYPE 1
- △ - MONUMENT TYPE 3
- ● - FOUND I. P.
- ○ - SET I. P.
- ■ - FOUND STONE
- □ - COMPUTED CORNER
- ✱ - OTHER

PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
DARDANELLE RESERVOIR
ARKANSAS RIVER, ARKANSAS

SEC. 30, T 8N, R 21W COUNTY POPE

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	ANGLE / GRID BEARING	ELEVATION / DISTANCE	POSITION / NORTH	POSITION / EAST	REMARKS
		528-1-2A		355.76	362,546.78	1,622,438.59	
	2		N62-13-40W	122.36'			
		528-1-3		344.99	362,603.76	1,622,330.33	
	3		N01-33-22E	294.64			
		528-1-3A		393.330	362,898.12	1,622,338.32	
	3		N01-33-22E	198.72			
		528-1-4		387.442	363,096.65	1,622,343.72	

SHEET 2 of 2

SWL FORM 136
REVISED FEB. 66
